把 10.47 億商機轉成可認列的年度計畫

進金生能源服務｜南區商業計畫．高階主管討論稿

原簡報目標

10.00 億

台糖兩案占合計

52.6 %

EPC 穩住基本盤。

建坤業務先釐清獲利模式。

AIDC 驗證後才加碼。

> **今天要決定**
>
> 口徑、下行風險與資源邊界，
> 不是直接宣告營收達標。



01 · REVENUE DEFINITION R1

104.7% 是商機覆蓋率，不是營收達成率

原表主要採「案件總額 × 勝率」，還缺 2027 年度認列比例。

業務	目標 / 億	加權商機 / 億
統包工程 EPC	4.00	4.1392
建坤相關業務	6.00	6.3266
合計	**10.00**	**10.4658**

訂單證據
已簽約與商機分開

→

年度認列
範圍 × 當年進度

→

獲利與收現
成本、毛利、回款

目前超出目標僅 **0.4658 億**；沒有證據可當作營收安全墊。




證據：原簡報 p.2–4 | 保留原表總額；小額納入差異見 R7

影像：Oregon DOT · CC BY 2.0

02 · CONCENTRATION R2

台糖兩案決定一半以上結果，不是分散的機會組合

兩案同一客戶、同一機會擁有者，皆為 S1 / 勝率 40%。

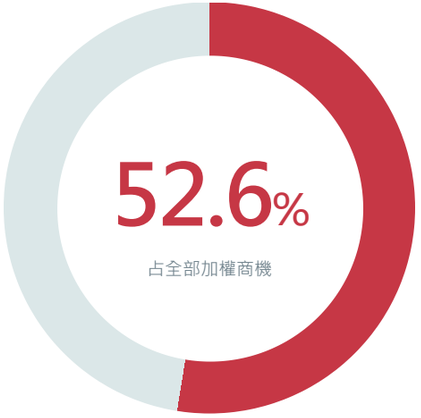

台糖兩案加權額

5.50 億

占建坤相關類別

86.9%

風險可能連動

同客戶與招標條件；不能假設兩案獨立。

容量邊界待核

高雄描述約 20MW 分 3 案；19MW 是否已含明正 6MW？



先核對招標包與容量邊界，**再決定基準預測與替補案。**

證據：S-03449 / S-03575 | 5.50 億 ÷ 10.4658 億 = 52.6%；是否重疊尚未確認

影像：pedrik · CC BY 2.0

03 · DOWNSIDE TEST R2 / R4

台糖若跨年，
10 億就不能直接當財務基準

只測台糖當年認列比例；其他案件的跨年度風險尚未調整。

台糖比例假設	合計情境值 / 億
100% 原表隱含	10.4658
50%	7.7158
25%	6.3408
0%	4.9658

情境假設，不是正式預測或保底。

維持原勝率 40%、其他加權額 4.9658 億不變；

25% 不是工期推算值，實際認列須由財務確認。



管理層要決定：**接受下修多少，哪些具名案件替補？**

計算：4.9658 億 + 5.50 億 × 假設比例 | 未指定情境機率，亦非會計認列方法

影像：pedrik · CC BY 2.0

先修重要日期與合約證據，才能重排季度

原季度表按月份可重現，但混入 2026 日期；開工季度不等於營收季度。

日煙

S-04153 · Sheet1 第 56 列

施工 2026/06 → 完工 2027/02

預計決標 / 簽約 **2027/03**

完工早於簽約，待確認。

台糖明正

S-03575 · Sheet1 第 19 列

施工 2026/10

預計決標 **2027/03**、簽約 **2027/05**

施工早於決標 / 簽約，待確認。

1.03 億

五筆案件標 100%，仍為 S4 / 進行中，且預計簽約日尚未到。

可能 CRM 未更新，也可能未簽約；必須查憑證。

不擅改日期、不把勝率當合約；**依年份重排認列與工量。**



施工資源按完整履約量準備，
不能按 40% 加權工程量排人。

情境示意，非本案實景

證據：清單 Q:T 日期欄；東南兩案 + 建坤城鋒 / 津谷 / 和富合計 103,319,991 元

影像：Oregon DOT · CC BY 2.0

資產管理要先拆商模，才能承諾穩定金流

目前 8 案呈現專案總價，尚未展示可續約管理費、毛利與回款。

01 一次性 EPC 工程

合約範圍、直接成本、年度施工進度。
工程收入不等於經常性收入。

02 資產開發 / 交易

釐清進能服 / 建坤的簽約與認列主體、
總額或淨額，以及是否重複計列。

03 年度管理 / 維運服務

年度費、續約、服務成本與回款，
才是「可重複金流」的證據。

名稱可暫用「建坤相關業務」，**不先假定全部都是服務收入。**



06 · DELIVERY CONSTRAINTS R3 / R5

接案先過三條硬邊界，不要用營收目標倒推資源

成本、收付款與施工產能未提供；此版不填入未經核定的假設數字。

獲利

毛利底線

直接成本、毛利額 / 率、
固定費用與保固風險。

待管理層核定

資金

墊款上限

保證金、採購、付款節點、
峰值資金與授信餘額。

待管理層核定

交付

施工容量

PM、設計、採購、班組、
長交期設備與分包。

待管理層核定

承接 / 擴張閘門

可獲利 ∩ 可收現 ∩ 可交付

其中一項不成立，就調整報價、付款條件、施工順序或接案規模。

成熟業務把**毛利與收現**放前面；AIDC 把**可承受小試**放前面。



資料缺口：成本 / 毛利、月度收付款、工程人力與設備容量 | 需補底表後才能核定

影像：Oregon DOT · CC BY 2.0

07 · EXECUTION ROADMAP

用里程碑更新計畫，不要等年底才看到缺口

建議節奏，尚待核定；先補逐案底表，再凍結基準與挑戰目標。

2026 Q4

定口徑、修日期、核合約

主管 + 財務 + 業務 | 補認列、成本與收付款

2027 Q1

EPC 簽約、台糖決標條件

業務 + 案件擁有者 | 實際合約與可開工證據

2027 Q2

EPC 交付、回款與台糖範圍

工程 + 採購 + 財務 | 月度毛利與資金峰值

2027 Q3

許可 / 饋線閘門、具名替補

PM + 業務 + 財務 | 未達節點即下修預測

2027 Q4

認列與跨年訂單分開、AIDC 審查

財務 + 工程 + AIDC | 按進度認列，不預支未來

48 小時先做：**核日期 → 補證據與財務 → 拍板五個問題。**



月度看板同步看收入、毛利、收現、關鍵路徑與施工容量。

情境示意，非本案實景

AIDC 在 2027 先驗證，2028 / 2029 按進度預測

三案加權 10 億是商機池；需先釐清進能服真正可承包的範圍。

50 億
三案整案總額

× 20% →

10 億
勝率加權商機

2027/12
預計簽約

→

2028/06
預計施工

→

2029/06
預計完工

01 客戶與商務 需求、付款意願、合約路徑、履約範圍。

02 電力與交付 接入、設計、合作夥伴、成本報價。

03 試點與停損 驗證成果、資源與損失上限，再決定加碼。

三案皆同一客戶，**不能把三個場址視為三個獨立客群。**



證據：S-03382 / S-04086 / S-04088 | 麻豆 30 億、桃園 / 嘉惠各 10 億；客戶均台灣大哥大

影像：Carl Lender · CC BY 2.0

09 · FIVE DECISIONS

先拍板五個問題，下一版才知道如何修改

把討論收斂到口徑、商模、重大案、資源與驗證，不增加新口號。

1. **10 億是什麼口徑？**
   當年可認列營收、簽約額，還是加權商機池？
2. **資產管理靠什麼賺錢？**
   一次性工程 / 資產交易，還是可續約管理與維運？
3. **台糖失利，如何取捨？**
   可接受下修多少；由哪些具名案件替補？
4. **接案的硬邊界在哪？**
   毛利底線、峰值墊款上限、同時施工容量是多少？
5. **AIDC 何時才可加碼？**
   2027 要驗證到何種成果，才承諾 2028 財務目標？

待 David / 管理層拍板；**再凍結基準、挑戰與資源配置。**



影像：Carl Lender · CC BY 2.0
