
ACMEPOINT ENERGY SERVICES

進金生能源服務(股)公司

南區預算報告

2026.10.06

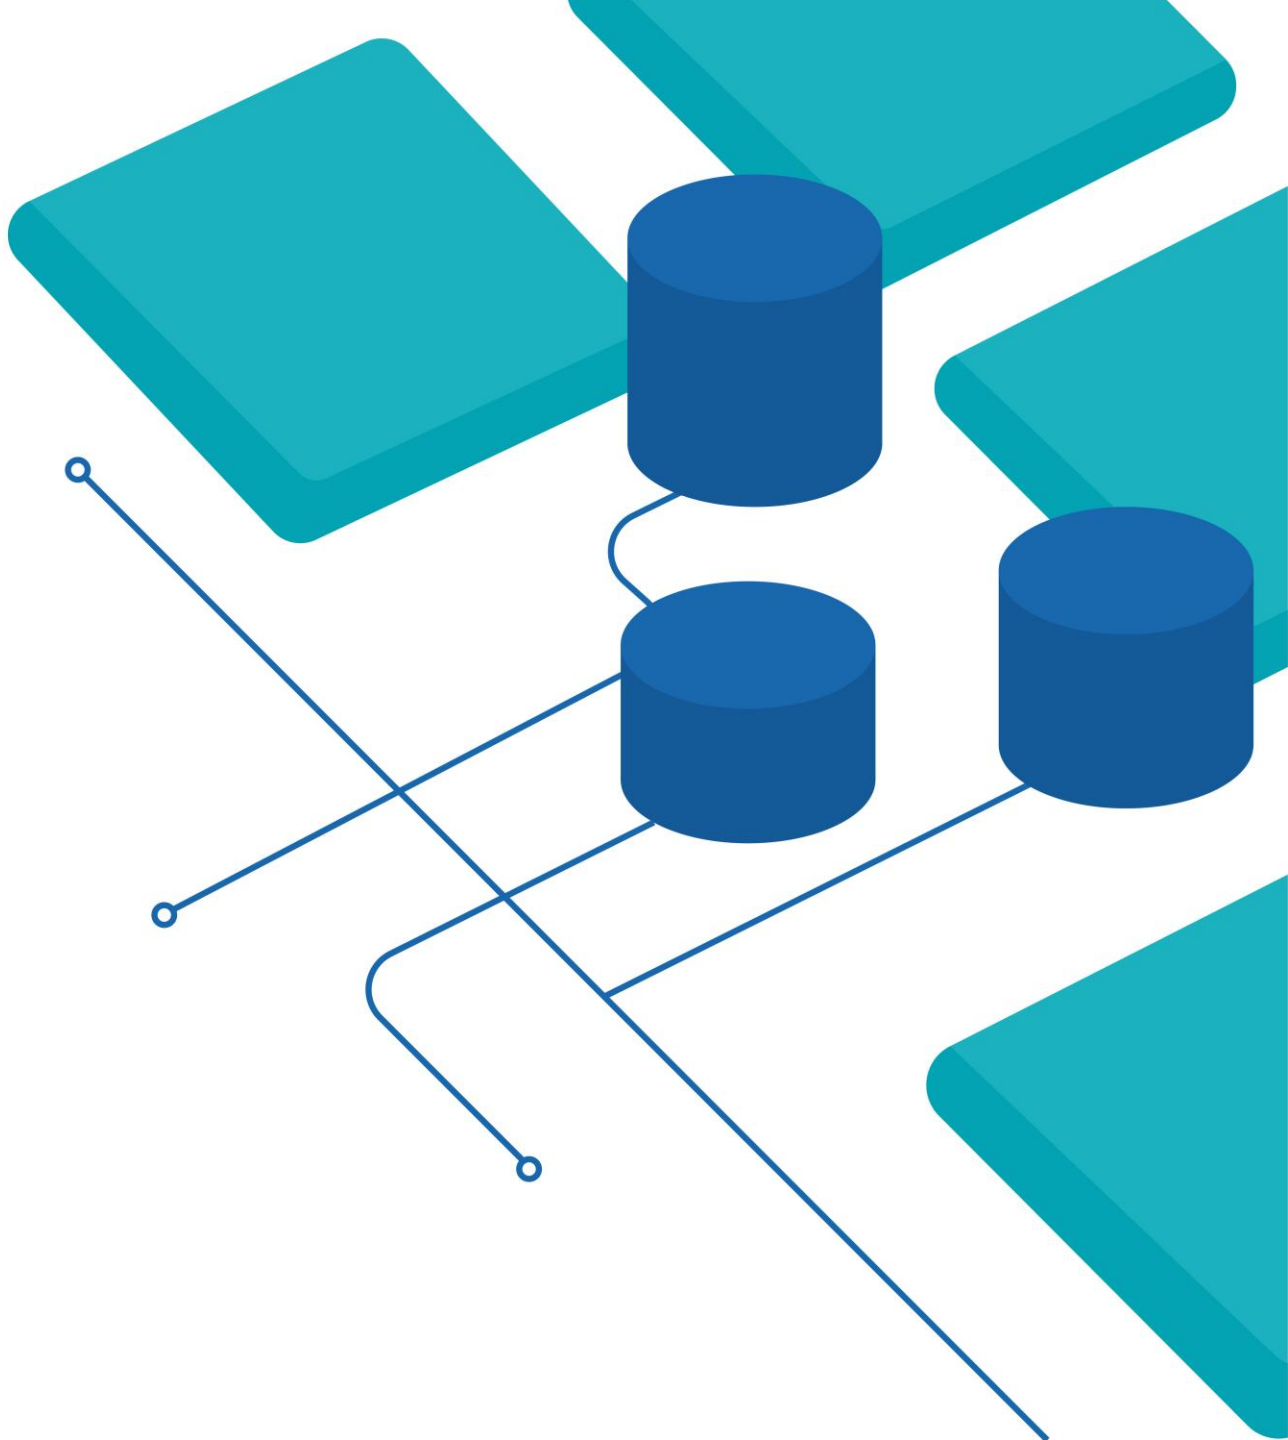

FY27南區預算

ACMEPOINT ENERGY SERVICES

執行摘要

統包工程 + 資產管理合計 **1,046,583,908 元**

FY2027 結構轉型

統包工程 4 億 + 資產管理 6 億，合計目標 10 億

FY2028 算力

資料中心（AIDC）整廠電力交付，年度目標 10 億

R6

① 統包工程（EPC）

目標 4.0 億 / 40%

聚焦科技自用屋頂、大學/防災微電網、車棚，維持高週轉率與現金流。

② 資產管理（建坤）

R3

目標 6.0 億 / 60%

主攻台糖大案代操、老舊案場整新、電能管理，建立高毛利穩定金流。

③ 資料中心（AIDC）

中長期目標 10.0 億

進能服定位為電力交付端統包，承接特高壓變電站與灰區不斷電備援，啟動第二成長曲線。

R1

業務類別	原訂目標（元）	目前預估（元）	達成率
①統包工程	400,000,000	413,921,102	103.5%
②資產管理	600,000,000	632,662,806	105.4%
合計	**1,000,000,000**	**1,046,583,908**	**104.7%**

統包工程（37案）　資產管理（8案）

紅圈見末頁：R1 加權≠營收 / 達成

資產管理案件明細

案件名稱	容量(kWp)	總金額（元）	勝率	FY2027預估（元）
(建坤)台糖停車場	19,000	1,045,000,000	40%	**418,000,000**
(建坤)台糖明正停車場	6,000	330,000,000	40%	132,000,000
(建坤)埔美國際	3,300	115,500,000	20%	23,100,000
(建坤)津谷食品	849	26,137,188	100%	26,137,188
(建坤)和富工業	435	17,626,005	100%	17,626,005
(建坤)城鋒新建廠房	211	10,928,088	100%	10,928,088
(建坤)潤泰精密	499	18,962,000	20%	3,792,400
(建坤)台南麻豆倉庫	432	21,582,500	5%	1,079,125

R2

R5

R2 台糖兩案占合計 52.6%、本類 86.9%　|　R4 跨年 / 日期矛盾　|　R5 100% 勝率需合約佐證

統包工程前10大案件明細(共37案)

案件名稱	容量(kWp)	總金額（元）	勝率	FY2027預估（元）
日煙（屋頂）	5,000	175,000,000	60%	105,000,000
微電網_中山大學微電網	3,000	90,000,000	40%	36,000,000
微電網_防災型一批	10,000	350,000,000	10%	35,000,000
東南實業_彰化廠（丸紅）	805	31,395,195	100%	31,395,195
中永峰（路竹淡水漁電室內養殖場）	1,436	40,194,000	50%	20,097,000
東南實業_台中廠（丸紅）	442	17,233,515	100%	17,233,515
桃苗中壢廠	436	21,168,310	80%	16,934,648
東陽實業（新市）	9,600	336,000,000	5%	16,800,000
東和（特力屋）	1,999	69,978,300	20%	13,995,660
翔展精密（順順展既有廠）	580	20,300,000	60%	12,180,000

R4

R5

R7

前 10 大案合計占統包工程類別約 76%，其餘 27 案金額較小、相對分散，風險分散度佳

依施工季度分布

季別	統包工程（元）	資產管理（元）	合計（元）
Q1	188,960,189	15,799,613	204,759,802
Q2	168,006,980	43,763,193	211,770,173
Q3	35,416,578	23,100,000	58,516,578
Q4	21,537,355	**550,000,000**	**571,537,355**

R2

R4｜此表不是年度認列表

日煙施工寫 2026/06；
台糖明正施工寫 2026/10。
按月份分組會混入錯誤年份。
先核對日期，再重算工程、
營收與現金流三張表。

統包工程集中上半年（Q1+Q2 占 **86%**）；資產管理集中 Q4，主因台糖停車場（施工 2027 年 10 月）單案占 Q4 資產管理金額 **76%**。

中長期佈局——FY2028 資料中心



30MW 算利中心（麻豆）

30 億元，20% 勝率加權 6.0 億元。


R6



10MW 算利中心（桃園）

10 億元，20% 勝率加權 2.0 億元。2027 提前卡位北部算力布局，建立跨區域交付能力。

R6

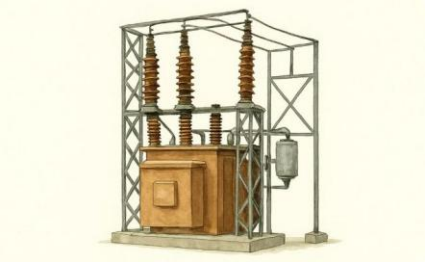

10MW 算利中心（嘉惠）

10 億元，20% 勝率加權 2.0 億元。2027 南部能源補位，配合麻豆案形成雙核布局

R6

三案皆預計 2028/06 開工、2029/06 完工，且同一客戶。

10 億是整案勝率加權商機；進能服可承包範圍、2028 認列比例与驗證資源仍待確認。

圈註索引｜哪些地方要改、哪些地方待確認

前 6 頁保留原文字與數字；紅圈是審閱提醒，不代表問題均已確認

編號	問題 / 風險	建議修改
R1	加權商機被標為預估 / 達成率	改商機覆蓋率；另列在手訂單與年度認列
R2	台糖兩案占合計 52.6%	核範圍與跨年；做下行 / 替補及完整履約資源
R3	資產管理高毛利穩定金流未證明	拆工程 / 資產交易 / 服務；補毛利與收現
R4	日煙與台糖明正日期矛盾	先核對，不擅改；按年份重排工量與認列
R5	100% 勝率尚不等於已簽約	查合約 / CRM更新；補施工容量与資金表
R6	AIDC 10 億不是已驗證年度收入	2027驗證；2028/2029依範圍與進度分期
R7	前十大占比與納入規則需統一	占比改73.6%；確認跨年申設案是否排除

重要：毛利、人力、墊款與認列資料未提供；不在此審閱稿中填入未經核定的假設數字。

圈註依據：機會清單_20261005.xlsx｜詳細證據與欄位見 2027商業計畫_審閱摘要_20261006.md

五個問題，決定下一版如何修改

先拍板方向與邊界，再修改數字與資源配置

1	**10 億是什麼口徑？** 2027 可認列營收、簽約額，還是加權商機池？	**改：目標 / 預測 / 商機三層表**
2	**資產管理靠什麼賺錢？** 一次性工程 / 資產交易，還是可續約管理與維運？	**改：商模、認列主體與毛利**
3	**台糖失利，如何取捨？** 可接受下修多少；用哪些具名案件替補？	**改：三情境、替補與啟動條件**
4	**接案的硬邊界在哪？** 毛利底線、峰值墊款上限及同時施工容量是多少？	**改：報價、授信、人力與排程**
5	**AIDC 何時才可加碼？** 2027 要驗證到何種成果，才承諾 2028 財務目標？	**改：驗證預算、里程碑與停損**

待 David / 管理層拍板：口徑、商模、下行與替補、資源邊界、AIDC 驗證條件。

資料基準：機會清單_20261005.xlsx | 圈註版新增決策頁 | 2026-10-06
